


★二見港における防波堤ケーソン据付工事実施についてのお知らせ★

二見港において防波堤（沖）ケーソン等据付工事を次のとおり実施しますので、航行する船舶は十分注意の上、安全確保にご協力下さい。

発注者 兵庫県東播磨県民局県土整備部
加古川土木事務所 港湾課
TEL 079-421-9399

1. 作業期間 自 平成30年 4月 23日 作 業 時 間
 至 平成30年 9月 30日 日出より日没まで
2. 施工位置 二 見 港 （下図参照）

*お願い：工事中は安全確保のため右側航行（出船南側 入船北側）・徐行にてお願いいたします。

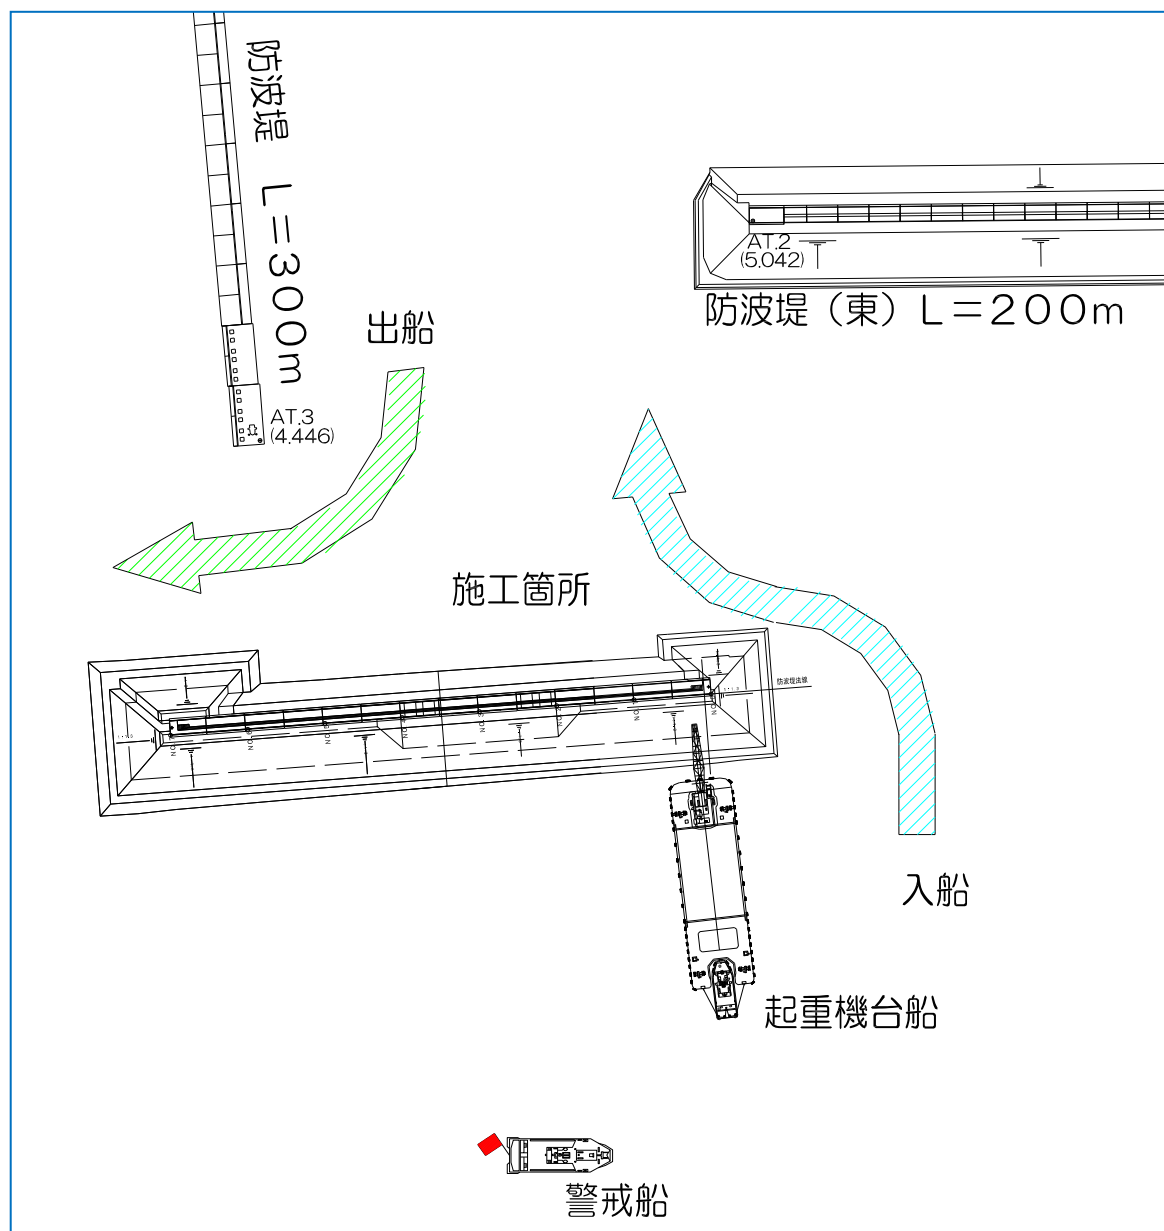

容 容

| 作 業 内 容 | 使 用 船 舶 | 作 業 実 施 期 間 （ 予 定 ） |
|-------------------|--------------|---------------------|
| 準備工（現場事前測量等） | 船外機1隻/1日 | 平成30年4月23日～5月20日頃 |
| 消波ブロック撤去 | 起重機船 1隻/1日 | 平成30年5月1日～5月13日頃 |
| 基礎捨石工 | 起重機船、潜水土船 | 平成30年5月15日～6月15日頃 |
| ケーソン据付・中詰・蓋コンクリート | 起重機船、潜水土船 | 平成30年5月29日～6月2日頃 |
| 胸壁工 | 船外機船、フェリーバージ | 平成30年5月20日～6月15日頃 |
| 上部工 | 船外機船、フェリーバージ | 平成30年6月5日～6月15日頃 |
| 被覆石工 | 起重機船、潜水土船 | 平成30年6月15日～6月27日頃 |
| 消波ブロック据付 | 起重機船 1隻/1日 | 平成30年6月28日～7月20日頃 |

4. 警戒等 作業台船及び潜水土船の作業中は、作業区域付近に警戒船を配置し、接近船舶のある場合は「海上作業中」である旨連絡・注意を喚起します。又、潜水土船に使用する錨綱は、浮力の無い綱を使用し、かつ後方アンカーにシンカーブロックを設置し投錨範囲を小さくなるようにします。

5. 施工者 松 陽 建 設 株 式 会 社

連絡先 高砂市中筋1丁目6番17号 電話 079-448-8220 FAX 079-448-9120
現場代理人：山本 晃 電話 090-8755-3432
監理技術者：柴崎 晋策 電話 090-2197-9018
